

DELRAPPORT



Liv i bygda

- utvikling i Sømna og Brønnøy

Et samarbeidsprosjekt mellom Sømna og Brønnøy for å fremme
bolyst, tilflytting, landbruk og utvikling av arbeidsplasser

Finansiert av:



Nordland
FYLKESKOMMUNE



Brønnøy
Kommune



Fylkesmannen i
NORDLAND



Sømna
Kommune

1. Innledning

Denne delrapporten gjelder år 1. i et treårig prosjekt.

Av forskjellige årsaker sluttet prosjektleder sitt arbeid i prosjektet etter å ha vært i stillingen hele 2014. Dette har medført at det ikke har vært aktivitet i prosjektet i løpet av 2015 med unntak av et etablererkurs som ble avsluttet i februar i år.

Det har vært litt utfordrende å utarbeide denne rapporten da den mest sentrale personen i prosjektet ikke har deltatt, men vi har etter beste evne prøvd å presentere de viktigste aktivitetene i prosjektet. Vi hadde også ønsket å ha tilgang til bildematerialet som prosjektleder samlet i løpet av året, men dette forsvant sammen med ham.


Vi håper at vi i lag med Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling kan få aksept for å gjennomføre de to siste årene av prosjektet i 2016 og 2017. Planene for en slik aktivitet legges fram i en korrigert prosjektbeskrivelse.

Sømna 1. oktober 2015

Rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppa ved

(Sign)

.....
Knut Horn
Nærings sjef




.....
Tor-Arne Bakke
Nærings- og kultursjef



.....
Nils Nyborg
Jordbrukssjef

(Sign)

.....
Odd-Reidar Johnsen
Landbrukssjef



.....
Bjørn Sylten
Fagkonsulent

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Bakgrunn og formål:	5
3. Organisering av prosjektet:.....	5
3.1 Prosjektleder:.....	5
3.2 Styringsgruppe	5
3.3 Arbeidsgruppe.....	6
3.4 Administrativt:.....	7
4. Aktiviteter i regi av prosjektet i 2014	8
4.1 Logo.....	8
4.2 Utadrettet virksomhet	8
4.2.1 Hjemmeside	8
4.2.2 Facebookside	9
4.3 Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB).....	9
4.4 Lederforum / Næringsstyre / Driftsstyre II / Regionråd/Kommunestyret	9
4.5 «Liv i Bygda» - Maskoter	10
4.6 Bondepub.....	11
4.7 Traktorpulling.....	11
4.8 Fokus på frukt og bær	12
4.9 Våre nye innbyggere	13
4.10 Grendemøter	13
4.11 Etablererkurs.....	14
4.12 Sømna Grønnsakslager.....	14
4.13 Tre årlige konferanser / Treffpunkt Sør-Helgeland	15
4.14 Diverse møter med enkeltpersoner	15
4.15 Besøk fra fylkesmannens landbruksavdeling.....	15
5. Veien videre.....	16
5.1 Utfordringer i prosjektet	16
5.2 Økonomi - regnskap	16
5.3 Avslutningsord.....	17

2. Bakgrunn og formål:

Med bakgrunn i felles utfordringer har Sømna og Brønnøy kommune startet dette prosjektet. Målet er å trygge bosetting, skape bolyst, sikre arbeidsplasser, støtte opp om det tradisjonelle landbruket og skape nye arbeidsplasser. Interkommunalt samarbeid skal også styrkes gjennom prosjektet. Geografisk favner prosjektet hele Sømna samt grendene Trælnes, Kvervet og Rodal i Brønnøy.

Begge kommuner har gått inn med egne midler og egen arbeidskraft og er også meget godt fornøyd med å ha fått støtte fra Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling til arbeidet.

Før oppstart ble prosjektet forankret både i næringsstyret og landbruksnemnd i Sømna samt i driftsstyre II i Brønnøy. I tillegg har kommunestyret i begge kommuner vedtatt at de ønsker å kjøre prosjektet. I løpet av prosjektet har det blitt orientert om framdrift og organisering i de samme organene flere ganger.

3. Organisering av prosjektet:

3.1 Prosjektleder:

Stillingen ble lyst ut i juli 2013 og vi fikk inn 11 spennende søkere. 7 stykker var på intervju hvor både næringssjef, jordbrukssjef, rådmann, personalsjef og tillitsvalgte i Sømna kommune var tilstede. Etter runden var det enighet om at den vi ønsket var Torgeir Karlsen fra Fauske som akkurat hadde avsluttet et treårig prosjekt i regi av Fylkesmannen i Nordland.

Han hadde sitt første besøk i Sømna i uke 43/2013 hvor han møtte både representanter fra landbruk og annet næringsliv, administrasjon og politikere i begge kommuner og fikk presentert aktuelle steder å bo.

Han tiltrådte stillingen den 6 januar 2014 og hadde med mange spennende og spenstige tanker. Vi så det som positivt at han «kom utenfra» og med nye øyne kunne se utfordringene og mulighetene i Sømnasamfunnet. Han ble ansatt i 100 % stilling.

3.2 Styringsgruppe

Opprinnelig var det planlagt en styringsgruppe på fem personer:

- 1 fra Sømna næringsstyre
- 1 fra driftsstyre 2 i Brønnøy
- 1 fra Sømna bondelag
- 1 fra Trælnes Vel
- 1 fra Sømna Næringsforening

Med bakgrunn i signal fra fylkeskommunen om at vi burde ha særlig fokus på ungdom og flyktninger fremmet prosjektleder ønske om styringsgruppa burde utvides. Dette ble tatt til følge og på første møte i styringsgruppa den 10.02.2014 ble sammensetningen slik:

- Torstein Graven, Sømna næringsstyre - vara Arild Barlien - leder
- Stig Arve Høivik, driftsstyre 2 Brønnøy - vara Torleif Sandøy - nestleder
- Per Ståle Hauan, for Kvervet, Trælnes og Rodal - vara Bente Solvold
- Bjørn Torstein Arnes, Sømna Bondelag - vara Tor Erik Sund
- Hans Ivar Slåttøy, Sømna næringsforening - vara Thayanantan Arumairasa
- Johan Warholm, Sømna kommunale ungdomsråd - vara Marie Solli Oppegaard
- Nansy H. Hansen, Sømna Frivilligsentral - vara Tone Johansen
- Hanadi Abu Taqia, flyktningerepresentant NAV - vara Kine Øyan



På det første møte i styringsgruppa også arbeidsgruppa samt ordfører og rådmann i Sømna. Her orienterer prosjektleder Torger Karlsen om innholdet i prosjektbeskrivelsen siden deltagerne i styringsgruppa i liten grad kjente prosjektet. Foto: Nils Nyborg

Oppmøtet var bra og det samme var engasjementet på det første møtet. På resten av møtene stilte kun prosjektleder i lag med gruppa. Oppmøte var til dels dårlig og både prosjektleder og deltagerne i styringsgruppa følte at engasjement og framdrift var så dårlig at det var frustrerende.

3.3 Arbeidsgruppe

- Nærings og kultursjef Tor-Arne Bakke (Sømna)
- Næringssjef Knut Horn (Brønnøy)
- Jordbrukssjef Nils Nyborg (Sømna)
- Fagkonsulent Bjørn Sylten (Sømna)
- Landbrukssjef Odd Reidar Johnsen (Brønnøy)

Arbeidsgruppa hadde 6 formelle møter (24/1, 7/3, 21/3, 7/4, 6/5 og 17/6) samt en rekke uformelle møter og arbeidsmøter knyttet til konkrete prosjekt/tiltak.

I arbeidsgruppa var oppmøtet bra og stemningen god på de første møtene. Prosjektleder var ikke kjent i kommunen og ønsket tid og fokus på hvordan prosjektet skulle gjennomføres og vi hadde mange gode diskusjoner rundt dette. Etter hvert ble medlemmene i arbeidsgruppa utålmodige på at «ting måtte begynne å skje» og også disse møtene ble etterhvert preget av frustrasjon både fra medlemmene i arbeidsgruppa og prosjektleder.

Vi opplevde også at de aktivitetene som ble dratt i gang i regi av prosjektet i liten grad fikk oppslutning av innbyggerne i kommunen.

3.4 Administrativt:

Prosjektleder hadde arbeidsplassen sin på rådhuset i Sømna og tett opp til landbruks- og næringsavdelinga som han hadde daglig kontakt med.

Administrativt ble prosjektleder plassert direkte under rådmannen og inngikk i rådmannens stab. Tanken var at det da ble lettere å gripe tak i tverrsektorielle problemstillinger og prosjektet ville få et bredere fokus enn hvis han ble ansatt på nærings- eller landbrukskontoret.

Rådmannen i Sømna er prosjekteier.

4. Aktiviteter i regi av prosjektet i 2014

Prosjektet har vært involvert i og prøvd å dra i gang mange forskjellige aktiviteter i løpet av perioden. Her nevner vi noen av disse.

4.1 Logo

Prosjektleder tok tidlig initiativ til at vi bør ha en fengende logo og prosjektnavn. I samarbeid med ekstern grafiker ble det laget flere forslag. Disse ble behandlet både i arbeidsgruppe og styringsgruppe. Vi endte til slutt opp med et navn og en logo vi alle var fornøyd med.



4.2 Utadrettet virksomhet

Prosjektleder hadde ikke ønske om å profilere seg selv og sin person i forhold til prosjektet. Han avviste derfor mange henvendelser fra lokalavisene som ønsket å ha reportasjer om prosjektet og den nye prosjektlederen. Dette

Han la derimot mye arbeid i å få opp en hjemmeside og en facebookside for prosjektet.

4.2.1 Hjemmeside

Med bakgrunn i at prosjektet omfatter begge kommuner ble det laget en egen hjemmeside med link til både Brønnøy og Sømna sine hjemmesider.

Denne siden var oppe og gikk den 29 april.



4.2.2 Facebookside

Prosjektleder opprettet også en facebookside med navnet Liv i Bygda slik at men via denne kunne ha en dialog med innbyggerne i det geografiske området. Denne siden fikk raskt mange venner og ble brukt til å spre informasjon og få innspill.

4.3 Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)

Den 6. og 7. mars 2014 fikk vi besøk av rektor Dag Jørund Lønning som orienterte om at høgskolen var åpen for å bistå oss i arbeidet både med konkret hjelp og del-evaluering av prosjektet. Han var en sterk tilhenger av at slike prosjekt må utvikles nedenfra og bygge på innspill fra grasrota i stedet for å være «overstyrt». Prosjektleder skulle fortsette dialogen med HLB for å få utdypet et innhold i et slikt formalisert samarbeid, kostnaden med det og mulighetene for å få finansiert slik bistand.



Her orienterer Rektor Lønning styringsgruppa om hva HLB kan bistå med.

Fv


*Rektor Dag Jørund Lønning
Prosjektleder Torger Karlsen,
Trælnes Vel v/ Bente Solvold,
Frivilligsentralen, Nansy Hansen,
Ungdomsråd v/ Fredrik Moen
Næringsforeninga v/ Hans I Slåttøy*

4.4 Lederforum / Næringsstyre / Driftsstyre II / Regionråd/Kommunestyret

Prosjektleder var tilstede i alle disse organene og orienterte om prosjektet og planene og fikk tilbakemeldinger fra politisk hold om deres ønsker og tanker.

4.5 «Liv i Bygda» - Maskoter

Andre klasse ved Vik skole ble utfordret til å være Maskoter for prosjektet. De plukket ut et lite kosedyr, en liten kanin, som fikk navnet Liv og som skulle være med på forskjellige aktiviteter rundt omkring i bygda. Når Liv var med på noe ble dette lagt ut som bilder på hjemmeside / facebookside etterpå.

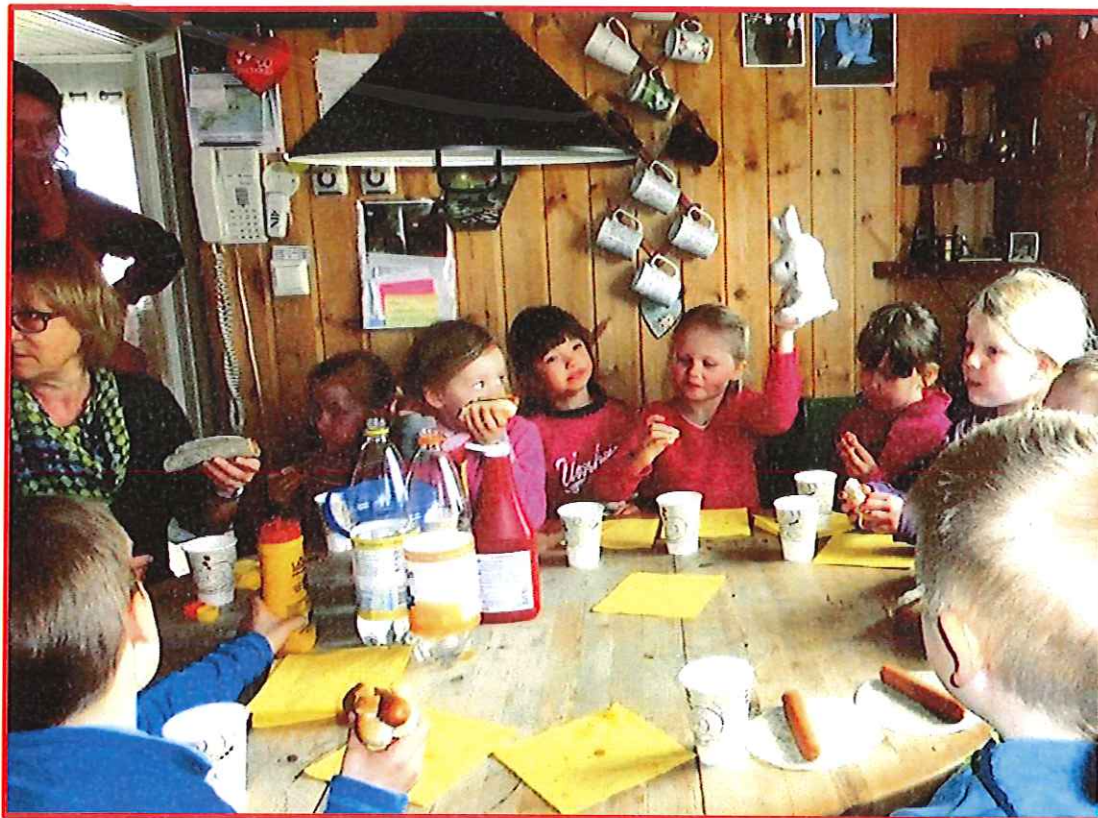

Den 8. mai var andre klasse på besøk hos gårdbrukerne Hilde og Charles Nyrud og får se på lam og kose seg med pølser og brød inne på kjøkkenet.

På bildet over holder Vanja maskoten «Liv i Bygda» i været.

På bildet til høyre har et lam funnet seg godt til rette i armene til Ella.

Alle elvene fikk T-skjorte med bilde av seg selv og «Maskoten Liv» etterpå. Foto: Nils Nyborg



4.6 Bondepub

Siden store deler av prosjektet skal handle om tradisjonelt landbruk arrangerte prosjektet bondepub den 4/6-2014 i lag med bondelaget. Her var det kafedialog og innspill fra gårdbrukerne i Sømna og søndre del av Brønnøy om de viktigste problemstillingene prosjektet bør arbeide med i treårsperioden. Styret i bondelaget fulgte opp dette på et styremøte den 17. juni hvor de spesifiserte sine ønsker.



Over: Jan, Tor-Erik og Lena er midt i en engasjert diskusjon.

Tv. Torger Karlsen presenterer hjemmesida til prosjektet og utfordrer deltagerne til å komme med innspill. Fv: John Terje, Bjørn Torstein, Jan, Rune, Tor-Erik og Tor-Martin. Foto: Nils Nyborg

4.7 Traktorpulling

Her i Sømna står landbruk og fokus på maskiner tungt. I lag med 2 personer fra styret i Sømna bondelag prøvde prosjektleder et stunt for å få til et slikt opplegg i Sømna. Det ble lagt ut informasjon på facebookside til prosjektet med invitasjon til et orienteringsmøte.

På et par døgn hadde bortimot 500 personer vært inne og sett på tiltaket og mange hadde klikket «Liker». Dette skapte store forventninger til oppmøte. På møtet kom det absolutt ingen personer og tiltaket ble ikke fulgt opp videre.



Illustrasjonsfoto fra Bedre gårdsdrift.

4.8 Fokus på frukt og bær

Vi har mye tradisjonelt landbruk i kommunen og tidligere hadde vi gartneri, grønnsaks- og bær dyrking. Dette er det lite av i dag og i lag med Steve Saltermark arrangerte prosjektleder to fagdager med fokus på bær dyrking. De to fagdagene ble godt besøkt. De rettet tiltaket mot

Fokus på frukt og bær

de som har bær som hobby i en bolyst-sammenheng, men med et håp om at noen vil utvikle næring av dette. Det ble også forsøkt en tredje fagdag, men denne ble avlyst pga for dårlig oppmøte.

Berg: I håp om å skape interesse for en mulig ny næring vil Steve Saltermark informere om bær og frukt dyrking. Der skjer på Berg skole 8. mai.



Informerer: Steve Saltermark vil informere om dyrking av frukt og bær på et møte i Sømna.

Brønnøysunds
Avis mai 2014.

Hagebruk - temakveld

Innledere Steve Saltermark og Kjell Arne Augustsson
Trenger du inspirasjon og nye innspill til hagen?

- Valg av bærtypen og bærkultur
 - erfaringsutveksling og råd
 - Bær, frukt og grønnsaker til eget bruk eller næring
 - Råd og tips for etablering og stell av felt
 - Beskjæringstips for bærbusker og frukttrær
- Allbrukshuset på Berg, torsdag 8. mai kl 19.00, rom 137
Velkommen!



Norsk
Landbruksrådgiving
Helgeland



Sømna kommune har regulert et areal ved meieriet til næringsutvikling og vil utrede muligheten med å bruke spillvarme til produksjon av bær, grønnsaker eller lignende.

Vi har engasjert Åge Jørgensen fra Bioforsk Særheim til å utrede dette for oss. Han er en av de fremste i landet innen jordbærproduksjon.

Arbeidet vil vi følge opp med to aktive jordbærprodusenter; Steve Saltermark fra Brønnøy og Odd Einar Vannebo fra Overhalla.

Det ble søkt fylkesmannens landbruksavdeling om støtte til utredningen, men søknaden ble ikke imøtekommet da den ble vurdert mangelfull og ikke gav dem grunnlag til å innvilge den.

4.9 Våre nye innbyggere

Sømna kommune har tatt imot 42 flyktninger. I tillegg har vi folk fra mange andre nasjoner som har flyttet hit. Det er et mål både å skaffe dem jobb og få dem integrert i det sosiale livet i kommunen. Prosjektleder deltok i en gruppe i lag med representanter fra NAV og Frivilligsentral. De møttes 14/8 og 25/9 og hadde tanker knyttet til fadderordning, praksis på gårdsbruk og mat.

Som avslutning på grunnlovsjubileet arrangerte Sømna kommune v/ bla Nærings- og kultursjef en International fest hvor våre nye innbyggere møtte lokalbefolkningen på en fin måte gjennom mat, dans og klesdrakter. Arrangementet samlet masse folk og var meget populært



Her ser vi Hebe og Nezar fra Syria som disket opp med festmat og kaker. Foto: BA-nett v/Norma Moen

4.10 Grendemøter

Et av målene i prosjektet er å skape liv og engasjement over hele kommunen og det var lagt opp til møter i alle grendene. I mai/juni inviterte prosjektleder seg til styrene i de fleste grendelag (Sund, Dalbotn, Berg Vel, Framheim og Trælnes) og utfordret dem til å arrangere grendemøter hvor han kunne komme og presentere prosjektet. Tilbakemeldingene fra styrene var at dette høstes lite interessant ut og det førte ikke til et eneste grendemøte.

4.11 Etablererkurs



Her ser vi 12 meget fornøyde deltagere som har fått kursbevis av Dag Erling Bjøru og Nils Nyborg. (Foto: Nils Nyborg)

Et av målene i prosjektet er å arrangere to etablererkurs i løpet av prosjektperioden. I perioden nov 2014 til feb 2015 arrangerte vi det første kurset. Kurset er støttet økonomisk fra Innovasjon Norge

Jordbrukssjefen var teknisk arrangør og Dag Erling Bjøru var innleid som lærer. 15 stykker meldte seg på. Av disse var 4 flyktninger, noe som tilsvarer 10% av flyktningene kommunen. (se eget referat)

4.12 Sømna Grønnsakslager

Potetprodusenter i Sømna har levert potetene sine til Trøndelag. En stor andel av potetene sorteres ut slik at de ikke får betalt for dem. De har derfor begynt å pakke potetene i mindre poser og selge dem gjennom forretninger i Sømna og Brønnøy.

Den 8/1 deltok prosjektleder i møte med dem og tilbød dem hjelp med å utforme poser med lokal logo. Dette synes produsentene var interessant, men prosjektleder fikk dessverre aldri tid til å følge opp dette.

Prosjektleder Torger Karlsen i lag med potetprodusent Alf Dahle på Sømna Grønnsakslager. Foto: Nils Nyborg




4.13 Tre årlige konferanser / Treffpunkt Sør-Helgeland

Det ble bestemt at vi skal gjennomføre tre regionale konferanser basert på interessante foredragsholdere og tilbakemeldinger gjennom kafedialog. Det skal være ulike emner hvert år:

- 2015 - Bosetting / bolyst / tilflytting / - by og stedsutvikling
- 2016 - Landbruk
- 2017 - Næringsutvikling/Kultur

Treffpunkt Sør-Helgeland ble gjennomført i november og var en stor suksess med dyktige foredragsholdere og masse positive tilbakemeldinger. (Se eget referat)

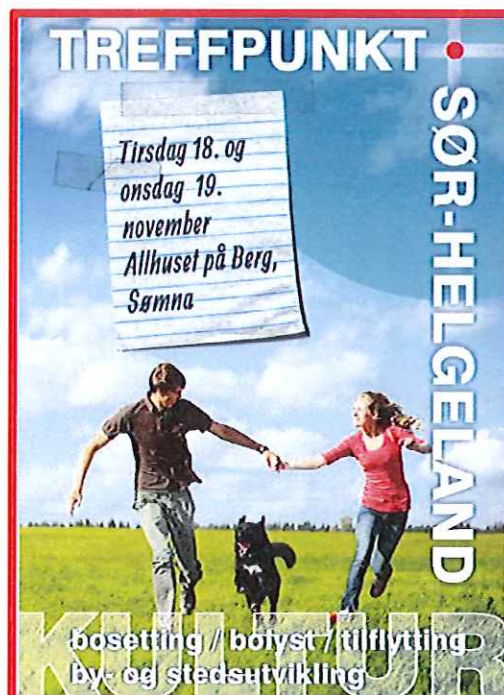

4.14 Diverse møter med enkeltpersoner

Prosjektleder hadde i løpet av året møter med mange enkeltpersoner som ønsket en dialog med prosjektet. Dette gjaldt slike forhold som næringsetableringer, tilflytting til området, utvikling av bolystiltak/kulturtiltak og annet. Det finnes dessverre lite skriftlig dokumentasjon på oppfølging av disse personene.

4.15 Besøk fra fylkesmannens landbruksavdeling

I oktober 2014 hadde vi besøk fra FMLA som fikk presentert en del prosjekt som det kunne være aktuelt å samarbeide om. I tillegg hadde vi en dialog knyttet til framdriften i prosjekt Liv i Bygda.

Her orienterer Anne Rød ved Helgeland Museum om prosjekt «Bygg i bygda. Fv Forsøksringen v/Knut Alsaker, Anne Røde, Leder i styringsgruppa Torstein Graven, FMLA v/ Alf Thynes og Toril Austvik



5. Veien videre

5.1 utfordringer i prosjektet

Utover i prosjektet ble det en økende frustrasjon alle som satt sentralt i det.

«Folk flest» hadde store forventninger til å prosjektet da det startet og forventet at noe skulle skje ganske fort. Prosjektleder som ikke kjente kommunen ønsket selvfølgelig tid til å bli kjent i kommunene og diskutere hvordan man skulle gripe an prosjektet.

Etter nesten fem måneder uten noen «synlige aktiviteter» i prosjektet begynte både innbyggere, politikere, styringsgruppe og arbeidsgruppe å bli frustrert. Dette begynte også å prege forholdet til prosjektleder. Når han så tok kontakt med samtlige grendelag uten at noen fulgte opp henvendelsen med å gjennomføre grendemøter ble dette oppfattet som negativt.

I prosjektbeskrivelsen har vi en rekke konkrete mål. Disse målene er utformet av administrasjonen i Sømna og Brønnøy, men ut fra behov vi vet innbyggere og næringsliv i kommunen har. Professor Lønning fra HLB forfektet i stor grad at et slikt prosjekt bør styres «Bottom up». Dette tok prosjektleder til seg og ønsket å avvente innspill fra innbyggerne i stedet for å gripe tak i prosjektbeskrivelsen – slike innspill kom i meget liten grad.

Vi hadde samtidig en uoversiktlig prosjektorganisering hvor prosjektleder var økonomisk og administrativt underlagt rådmannen som også var prosjekteier. Samtidig var ikke rådmannen med hverken i styringsgruppe eller arbeidsgruppe. Dette skapte usikkerhet knyttet til hvem som kunne fatte avgjørelser i prosjektet. Dette skapte også frustrasjon hos prosjektleder som i liten grad fikk klare svar på sine spørsmål, eller klare føringer for hva han skulle gjøre. Siden prosjektet heller ikke var fullfinansiert hvilte det en usikkerhet knyttet til økonomien i prosjektet som også preget aktiviteten.

Alle vi som har jobbet med prosjektet føler at det manglet oppslutning i kommunen og at det heller ikke skapte det engasjementet vi håpet. Etter signal både fra styringsgruppe, arbeidsgruppe og prosjektleder tok Rådmannen som prosjekteier avgjørelsen om å stoppe prosjektet ved årsskiftet 2014/2015.

5.2 Økonomi - regnskap

Fra prosjektets oppstart er det ført eget prosjektregnskap.

1. I prosjektets innledende fase (nov. – des. 2013) hvor bl.a. prosjektleder gjorde seg kjent, ble introdusert og deltok i en del treff og samlinger ble prosjektkostnader ført i prosjektregnskap, **Sømna kommune, Liv i Bygda - prosjektnr. 1428**
2. Fra det tidspunkt prosjektet er i full gang 01.01.14 er prosjektkostnader ført i prosjektregnskap, **Sømna kommune, Liv i Bygda - prosjektnr. 1116**

Samlet er det således ført kostnader i prosjektrengskapet for prosjekt Liv i Bygda som følger:

1. Prosjektnr. 1428	kr	59.116,49
2. Prosjektnr. 1116	«	<u>989.043,-</u>
3. Sum samlede prosjektkostnader pr. september 2015		<u>kr 1.048.159,40</u>

Treffpunkt Sør-Helgeland som er en del av det 3-årige prosjekt, med planlagte årlige treff, ble gjennomført som det første arrangement 18. november 2014. Treffpunktet hadde denne gang tema: bosetting/bolyst/tilflytting/by og stedsutvikling og samlet ca. 65 deltakere. Treffpunktet fikk svært god respons med gode tilbakemeldinger og ga åpenbart inspirasjon til deltakerne.

Kostnader ført i prosjektrengskapet i forbindelse med treffpunktet inngår i de samlede kostnadene ovenfor og beløp seg til kr 99.866,-. Eget arbeid / egeninnsats kommer i tillegg. Det føres eget regnskap for treffpunktet. Dette regnskapet er under avregning og blir oversendt fylkeskommunen de nærmeste dager (Fylkeskommunen bevilget kr 50.000,- til gjennomføringen av treffpunktet – tilskudd til stedsutvikling).

5.3 Avslutningsord

Både Sømna og Brønnøy kommune er enige om at utfordringene vi stod overfor da vi startet prosjektet fortsatt er like store og at hovedmålene vi satte i prosjektet er noe vi må fortsette å arbeide mot.

Vi har lært mye av det første året og ønsker både å endre organiseringen rundt prosjektet, spisse mål og tiltak og spesifisere ansvarsfordelingen mer når vi nå går videre med prosjektet.

Det er utarbeidet en ny og korrigeret prosjektbeskrivelse som vi mener vil gjøre det lettere å få til den oppslutningen og det engasjementet som kreves for at vi skal nå målene.

Sømna 1. oktober 2015
Arbeidsgruppa.
